




# COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE AMBIENTE - GREEN ECONOMY (ENERGIE RINNOVABILI), VERDE PUBBLICO, CIMITERI

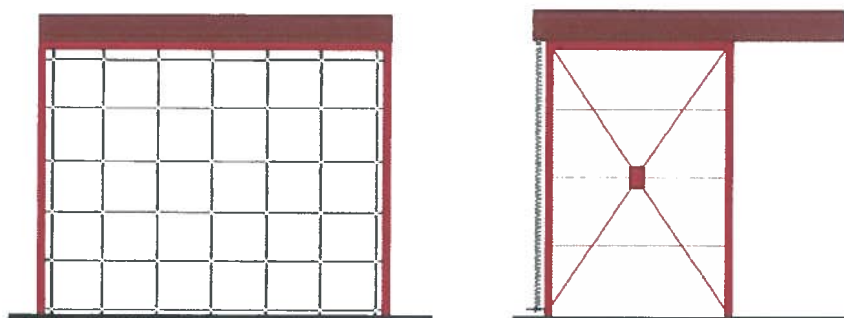

DATA\_FEBBRAIO\_2016

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COLOMBARIO SERIE 44B  
ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI TAVERNELLE

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato

REALIZZAZIONE DI 240 LOCULI  
IMPORTO €. 520.000,00

CRONOPROGRAMMA  
DELL'OPERA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
dott. ing. Luciano Lucchetti  
decreto sindacale n. 3 del 29/02/2016

IL SINDACO:

ASSESSORE LL.PP.:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Avv. Valeria MANCINELLI

Ing. Maurizio URBINATI

Arch. Maurizio AGOSTINELLI

PROGETTISTA:

Arch. Maurizio AGOSTINELLI

COLLABORATORE:

Geol. Roberto QUATTRINI

PROGETTISTA STRUTTURALE:

Ing. Cristiano PALLOTTI  
ISP Engineering s.r.l.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Geom. Massimo BASTIANELLI

RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA:

Geol. Stefano CARDELLINI

cimitero tavernelle

Serie 44/B

Di seguito viene indicato il cronoprogramma dei lavori indicati in oggetto che individua la cronologia delle fasi lavorative e la durata dei lavori. Detto cronoprogramma dovrà essere da guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

### CRONOPROGRAMMA

1. Impianto cantiere — recinzioni baracche - rilievi (due giorni lavorativi);
2. scarifica piazzale (due giorni lavorativi);
3. Spostamento rete fognaria e tubazione acqua (9 giorni lavorativi);
4. Picchettamento esecuzione armatura e getto pali fondazione (8 giorni lavorativi);
5. Scavi area sedime e movimenti terra (4 giorni lavorativo);
6. Realizzazione casseratura armatura cordoli, getto (8 giorni lavorativi);
7. Realizzazione solette, getto (9 giorni lavorativi);
8. Montaggio ponteggi (due giorni lavorativi);
9. Montaggio struttura metallica (15 giorni lavorativi);
10. Montaggio loculi (8 giorni lavorativi);
11. Montaggio parete laterali, tinteggiatura;
12. Montaggio copertura canali di gronda;
13. Montaggio lapidi (fasi 11. 12. e 13. 17 giorni lavorativi);
14. Smantellamento cantiere; (due giorni lavorativi)

Totale giorni lavorativi 86

Totale giorni lavorativi naturali e consecutivi 120 (centoventi).

| REALIZZAZIONE DI COLOMBARI SERIE 448 ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI TAVERNELLE |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Tot. Giorni LAVORATIVI NATURALI CONSECUTIVI |  |   |  |  |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | TOT. GIORNI LAVORATIVI                      |  |   |  |  |
| GIORNI LAVORATIVI   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86  |  |   |  |  |
| fasi  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120   |  |   |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 1   | Impianto cantiere – recinzioni baracche - rilievi          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 2   | Scarifica piazzale   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 3   | Spostamento rete fognaria e tubazione acqua                |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 4   | Picchettamento esecuzione armatura e getto pali fondazione |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 5   | Scavi area sedime e movimenti terra                        |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 6   | Realizzazione cassatura armatura cordoli, getto            |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 7   | Realizzazione solette, getto                               |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 8   | Montaggio ponteggi   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 9   | Montaggio struttura metallica                              |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 10  | Montaggio loculi   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |  |   |  |  |
| 11  | Montaggio parete laterali, tinteggiatura                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |  |   |  |  |
| 12  | Montaggio copertura canali di gronda                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |  |   |  |  |
| 13  | Montaggio lapidi   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X   |  |   |  |  |
| 14  | Smantellamento cantiere                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | X |  |  |
