

52 EDIFICI

120.000 mq circa
PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO

61 SCUOLE

INFANZIA

29

PRIMARIA

21

SEC. 1° GRADO

11

15

NIDI D'INFANZIA

387 SEZIONI

8161 ALUNNI TOTALI

ALUNNI TOTALI

521

(CAPIENZA MASSIMA RAGGIUNTA)

Servizio Manutenzioni e Protezione Civile

Interventi eseguiti, in corso e previsti

Anno 2024 – Didattica 2024/2025

FONDI IMU-TASI - € 340.000,00

FONDI OCDPC n.991/2023 - € 345.000,00

TOTALE FONDI - € 685.000,00



DIRIGENTE ING. RICCARDO BORGOGNONI

UBICAZIONE INTERVENTI ESEGUITI CON IMPRESE AGGIUDICATARIE FONDI IMU-TASI € 340.000,00

1	SCUOLA PRIMARIA DOMENICO SAVIO	I.C. CITTADELLA – MARGHERITA HACK
2	SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI	I.C. AUGUSTO SCOCCHERA
3	SCUOLA DELL'INFANZIA LA GINESTRA	I.C. QUARTIERI NUOVI
4	SCUOLA PRIMARIA FAIANI	I.C. CITTADELLA – MARGHERITA HACK
5	SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	I.C. ANCONA NORD
6	SCUOLA DELL'INFANZIA MANZOTTI	I.C. PINOCCHIO MONTESICURO
7	SCUOLA DELL'INFANZIA FANTASIA	I.C. GRAZIE TAVERNELLE
8	SCUOLA INF. LA GABBIANELLA E STELLA STELLINA	I.C. QUARTIERI NUOVI
9	SCUOLA PRIMARIA LEVI	I.C. PINOCCHIO MONTESICURO
10	SCUOLA INFANZIA ASPIO	I.C. PINOCCHIO MONTESICURO
11	SCUOLA SECONDARIA 1° DONATELLO	I.C. CITTADELLA – MARGHERITA HACK
12	SCUOLA SECONDARIA MONTESICURO	I.C. PINOCCHIO MONTESICURO

SCUOLA PRIMARIA «DOMENICO SAVIO»

- Rimozione di elementi ammalorati dalla copertura
 - Ripristino elementi in calcestruzzo ammalorati
 - INSTALLAZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO SOLAIO PIANI 1° E 2°
 - Allestimento Cantiere
 - Allestimento impalcatura
-
- Localizzazione intervento : **Via Torresi n. 48**
 - Importo contrattuale lavori: **€109.800,00**
 - Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
 - Stato dei lavori: **conclusi in data 06/09/2024**

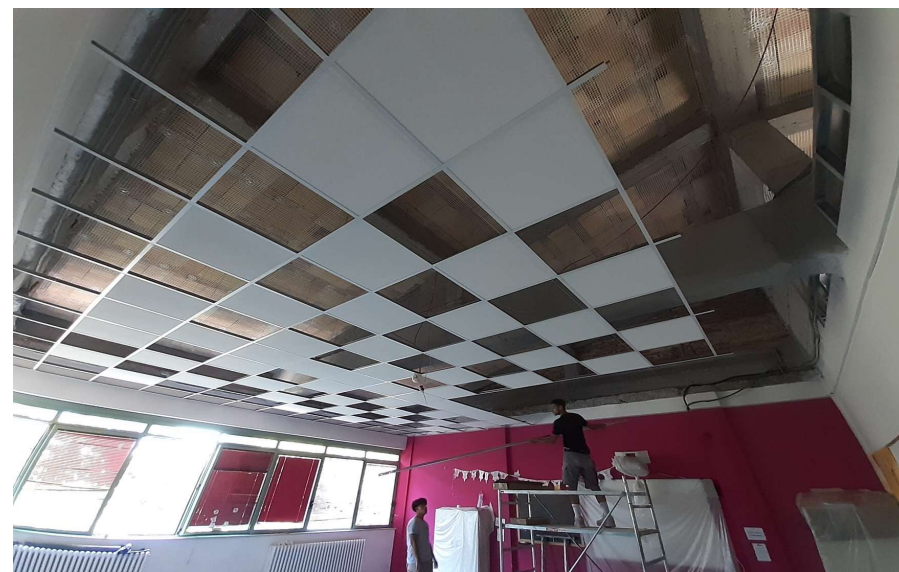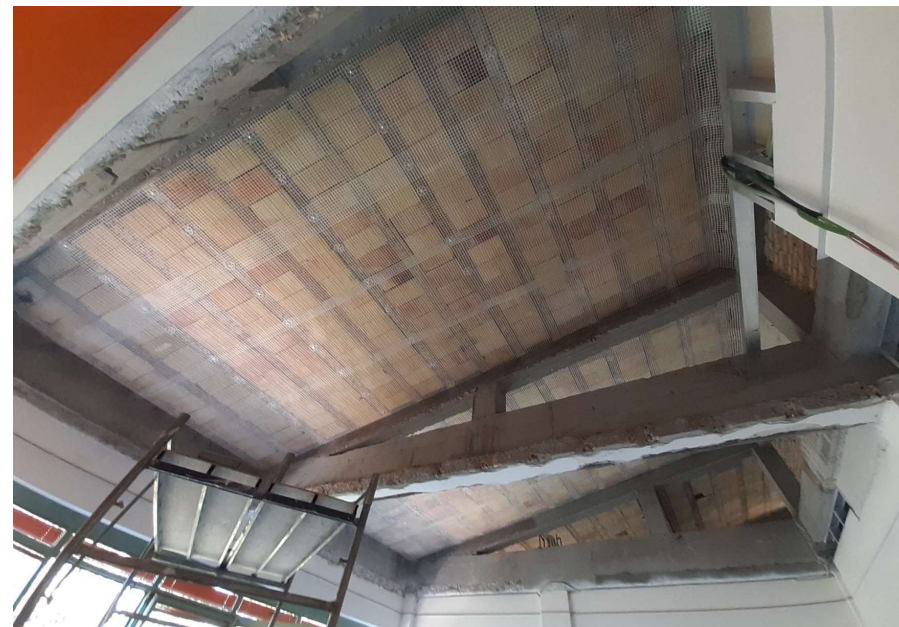

SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI

- Sostituzione canali e discendenti acque meteoriche
- Ripristino accessi al giardino e alla scuola
- Messa in sicurezza e livellamento giardino
- Ripristino delle armature e del calcestruzzo ammalorato dei passaggi pedonali a sbalzo


- Localizzazione intervento : **Via Podgora n.30**
- Importo contrattuale lavori: **€51.060,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori: **in esecuzione – fine il 31/12/2024**



SCUOLA DELL'INFANZIA LA GINESTRA

- Ripristino PORZIONI di intonaco su muri esterni
- Pulizia e ripristino smaltimento acque meteoriche (canali e discendenti)
- Sostituzione ringhiere ammalorate su rampa esterna
- Sistemazione marciapiedi esterni

- Localizzazione intervento : **Via Flavia N.2**
- Importo contrattuale lavori: **€ 14.640,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori: **fine lavori il 31/12/2024**

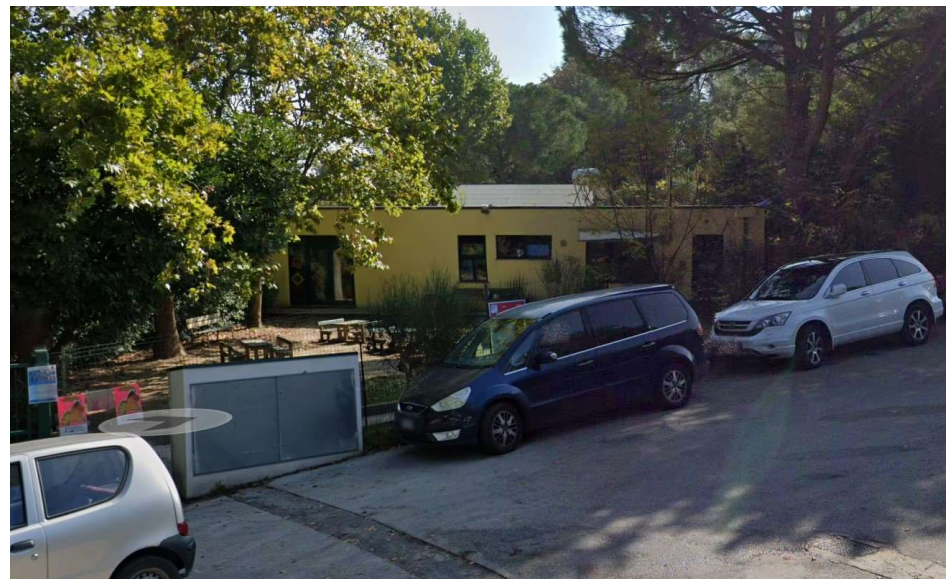

SCUOLA PRIMARIA FAIANI

- Tinteggiatura del refettorio
- Pulizia e ripristino smaltimento acque meteoriche (canali e discendenti)
- Realizzazione di nuova parete nel locale office
- Sistemazione marciapiedi esterni

- Localizzazione intervento : **Via Oberdan n.27**
- Importo contrattuale lavori: **€ 10.980,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori: **fine lavori il 31/12/2024**



SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

- Sostituzione di due porte di due aule e relativi lavori accessori (lav. di muratura, impianti e di falegnameria)
- Impermeabilizzazione di porzione del tetto con guaina bituminosa
- Parziale demolizione e ricostruzione di un bagno per adeguarlo dall'utilizzo degli adulti (prima bagno per infanzia)
- Ripristino delle murature di aule e locali di servizio
- Rimozione di macchie dovute ad infiltrazioni su solai di copertura

- Localizzazione intervento : **Via Metauro snc**
- Importo contrattuale lavori: **€ 25.520,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **conclusi in data 06/09/2024**



SCUOLA DELL'INFANZIA MANZOTTI

- Ripristino canali di gronda disassati
- Intervento sulle murature del vano scala e del refettorio per eliminazione della muffa e delle infiltrazioni


- Localizzazione intervento : **Via Sappanico**
- Importo contrattuale lavori: **€ 9.760,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **conclusi in data 06/09/2024**



SCUOLA DELL'INFANZIA FANTASIA

- Impermeabilizzazione di porzioni del tetto con guaina bituminosa
- Ripristino impianto di smaltimento acque meteoriche (canali e discendenti)

- Localizzazione intervento : **Via Fermo**
- Importo contrattuale lavori: **€ 13.400,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **fine lavori il 31/12/2024**

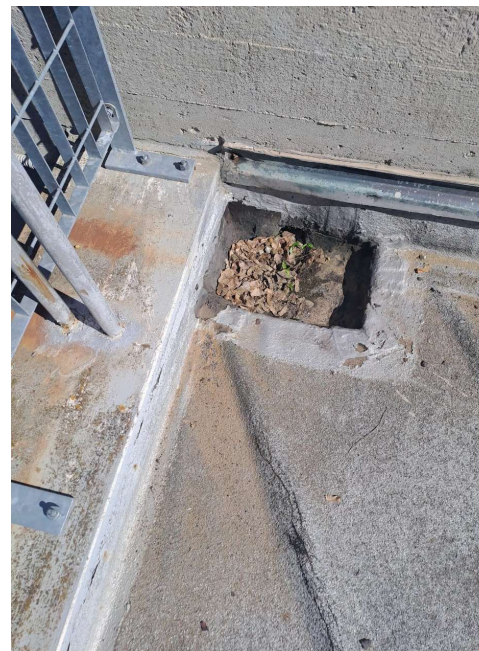

SCUOLA DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E STELLA STELLINA

- Impermeabilizzazione di porzioni del tetto con guaina bituminosa
- Ripristino impianto di smaltimento acque meteoriche (canali e discendenti)
- Tinteggiatura di porzioni di aule e locali di servizio

- Localizzazione intervento : **Via Togliatti n.60**
- Importo contrattuale lavori: **€ 15.860,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **in completamento entro il 30/09/2024**



SCUOLA PRIMARIA LEVI

- Demolizione, impermeabilizzazione e ricostruzione dei massetti e della pavimentazione dei solai a tasca i copertura
- Ripristino impianto di smaltimento acque meteoriche (canali e discendenti)
- Tinteggiatura di porzioni di aule e locali di servizio

- Localizzazione intervento : **Fraz. Montesicuro**
- Importo contrattuale lavori: **€ 21.720,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **fine lavori il 31/12/2024**



SCUOLA DELL'INFANZIA ASPIO

- Ripristino e consolidamento del muro di contenimento terra della corte esterna
- Ripristino della pavimentazione di ingresso
- Ripristino della staccionata esterna

- Localizzazione intervento : **Fraz. Aspio**
- Importo contrattuale lavori: **€ 26.840,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **fine lavori il 31/12/2024**



SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DONATELLO

- Pulizia e ripristino canali di gronda e pluviali ammalorati per smaltimento acque meteoriche
- Ripristino della muratura ritinteggiatura delle pareti lato scalinata
- Ripristino del cordolo ammalorato in cls del tetto


- Localizzazione intervento : **Via Tiziano n.50**
- Importo contrattuale lavori: **€ 16.200,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **fine lavori il 31/12/2024**



SCUOLA SECONDARIA MONTESICURO

- Ripristino intonaci e ritinteggiatura di tutte le aule e locali di servizio
- Impermeabilizzazione di porzioni del tetto

- Localizzazione intervento : **Fraz. Montesicuro**
- Importo contrattuale lavori: **€ 17.500,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **conclusi in data 06/09/2024**

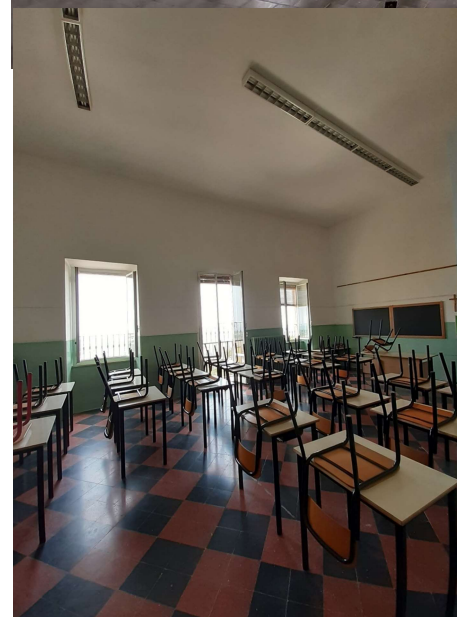

SCUOLE VARIE

- Pulizia canali di gronda e discendenti
- Piccole ritinteggiature spazi interni ed esterni
- Sostituzione di singole piastrelle di pavimentazioni interne ed esterne
- Stuccature
- Riprese di intonaci
- Stuccatura porzioni di cornicioni
- Messa a livello di tombini
- Ripristino recinzioni
- Sostituzione ceramiche
- Ripristino scale, balaustre e corrimano
- Rimozione muffa e ripristino della verniciatura

- Localizzazione intervento : **Comprensorio Comune di Ancona**
- Importo contrattuale lavori: **€ 6.720,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI 2024**
- Stato dei lavori **fine lavori il 31/12/2024**



UBICAZIONE INTERVENTO ESEGUITI DA ESEGUIRE FONDI OCDPC n.991/2023 € 345.000,00

1

SCUOLA DELL'INFANZIA XXV APRILE

I.C. CITTADELLA – MARGHERITA HACK

SCUOLA DELL'INFANZIA XXV APRILE

- Analisi Geognostiche e Geologiche sull'area di intervento
- Affidamento di incarico per la progettazione e la direzione lavori
- Intervento su blocco B dell'edificio con:
 - Demolizione e ricostruzione di tramezzi interni
 - Ripristino delle tamponature esterne con installazione di sistemi antiribaltamento
 - Ripristino dei solai e degli impianti al piano 1°
 - Consolidamento del solaio al PT del blocco B
 - Ripristino delle condizioni di agibilità

- Localizzazione intervento : **Via Torrioni**
- Importo contrattuale lavori: **€345.000,00**
- Fonte di finanziamento: **FONDI CDPC n.991/2023**
- Stato dei lavori: **affid. Lavori – chiusura 09/2025**



INTERVENTI SULLE SCUOLE SU SEGNALAZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI

1	NUMERO INTERVENTI ESEGUITI - 2024	CIRCA 450 (media di 70 al mese)
A	INTERVENTI DA IDRAULICO	60 %
A	INTERVENTI DA FABBRO/SERRAMENTISTA	20 %
A	INTERVENTI DA ELETTRICISTA	10 %
A	INTERVENTI DA MURATORE	10 %

INTERVENTI SU SEGNALETICA SRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE

1

SCUOLA SEC. 1° GRADO - PODESTI

2

SCUOLA DELL'INFANZIA - APORTI

3

SCUOLA DELL'INFANZIA - GRAMSCI

4

SCUOLA PRIMARIA – DOMENICO SAVIO

5

SCUOLA PRIMARIA - MAGGINI

6

SCUOLA DELL'INFANZIA - PINOCCHIO

ELENCO INTERVENTI

- **Rifacimento della segnaletica orizzontale**
 - Strisce pedonali
 - Linee della carreggiata
 - Parcheggi
 - Frecce
 - Stalli di sosta
 - Scritte
- **Segnaletica Verticale**
 - Verifica ed eventuale sostituzione di segnali stradali non idonei
- Installazione di nuovi segnali stradali
- Verifica impianti semaforici di attraversamento (dove presenti)
- Cartellonistica Toponomastica
- Verifica elementi di sostegno (pali)

